

2024 年 11 月停水事件分析报告

一、管网停水、维修事件概况

2024 年 11 月，维修共计 156 处（襄城 81 次、樊城 75 次），其中带水作业 63 处。计划性施工停水 2 次（襄城 2 次）；临时性施工停水 71 次（襄城 43 次、樊城 28 次），其中由于第三方施工损坏造成的停水共计 9 次，占临时性施工停水 12.68%。

二、停水、维修事件分析

（一）停水、维修情况统计表

1、管网维修统计表：


2024 年 11 月						
类别		襄城		樊城		本年 合计
		本年实际	去年同期	本年实际	去年同期	
维修管道（处）		81	56	75	84	156
其中	DN100 以下(含)	60	47	47	58	107
	DN150-DN250	18	5	16	16	34
	DN300-DN500	2	4	10	4	12
	DN600 以上	1	0	2	6	3

2、计划与临时性施工停水统计表：


2024 年 11 月			
停水	襄城管网公司	樊城管网公司	合计
计划性停水	2	0	2
非计划性停水	43	28	71
合 计	45	28	73



(二) 停水、维修情况统计分析图

1、管网维修次数统计图：

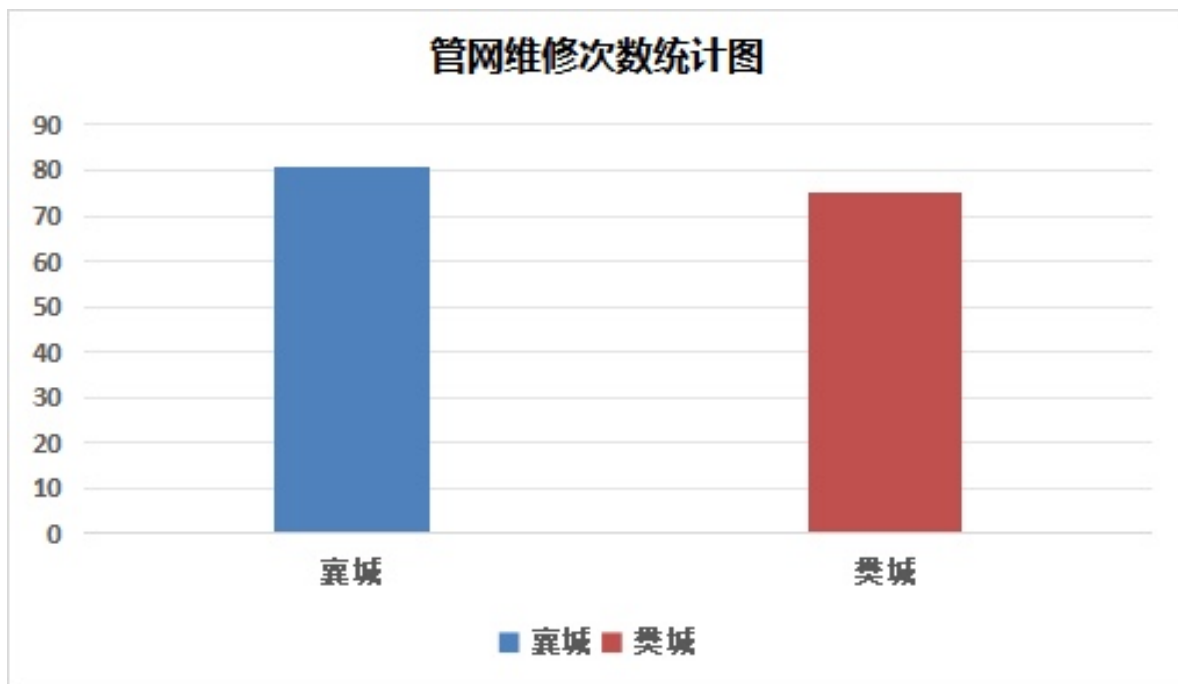

2、管网维修管径分析图：

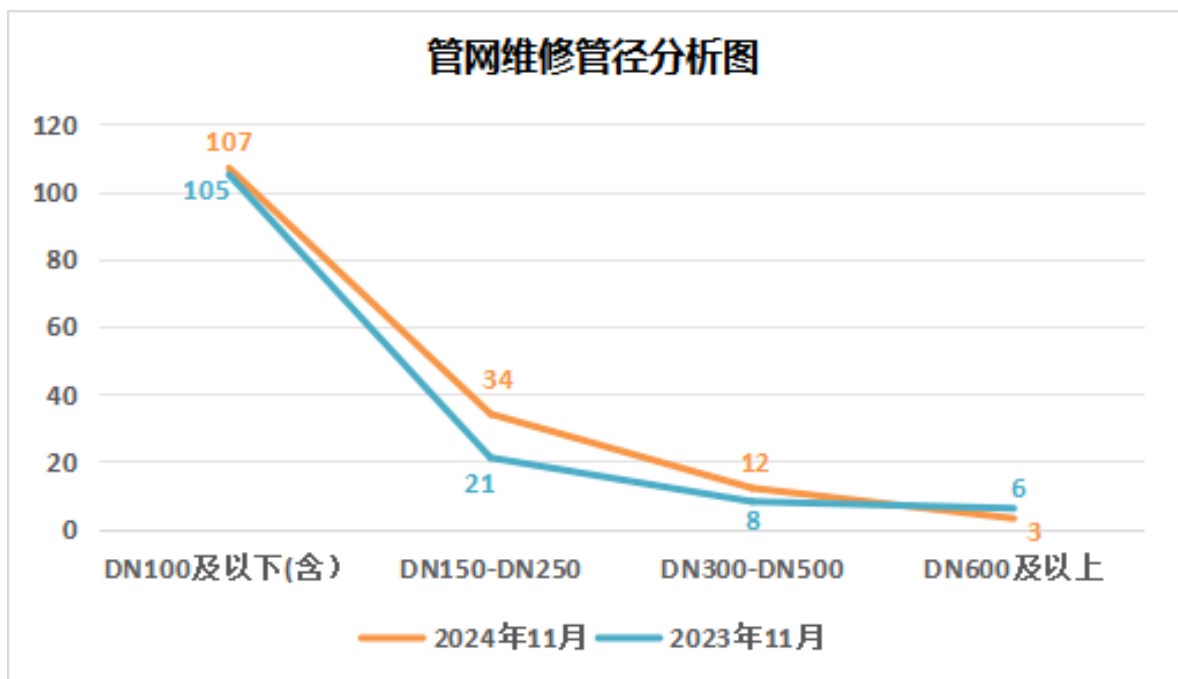

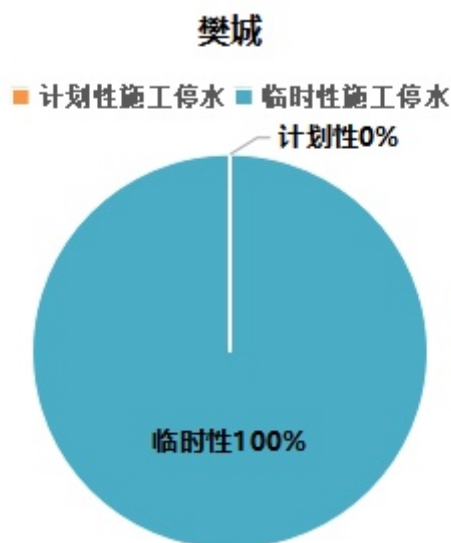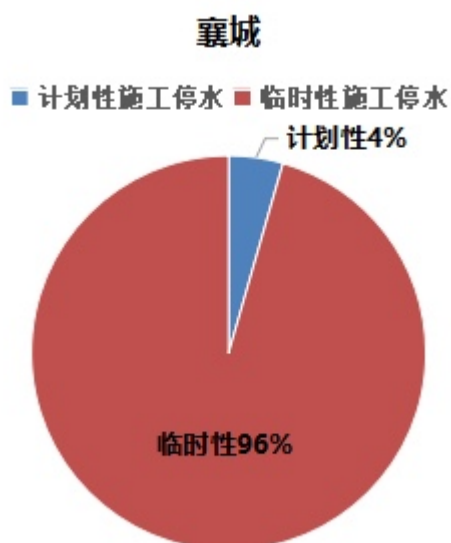

3、计划与临时性施工停水分析图：

三、小结

（一）本月无集中性、同一管线频繁性维修事件。

（二）本月维修均在用水低谷时段，采取降压供水和带水作业的方式进行，最大限度降低对用户用水的影响，抢修期间已及时安排为暂停供水区域的用户进行不间断的送水服务。

（三）本月计划性施工停水 2 件：

1、11 月 8 日，为优化供水管网布局，需对襄城南街文宣巷的供水管道进行改造，施工期间在陈侯巷、文宣巷设置多处临时取水点，以保障市民不间断用水。

2、11 月 15 日，为优化供水管网布局，需对襄城曹湾路的供水管道进行改造，施工期间在欧庙镇设置多处临时取水点，以保障市民不间断用水。

襄阳中环水务有限公司
2024 年 11 月 29 日
