

2025 年 4 月停水事件分析报告

一、管网停水、维修事件概况

2025 年 4 月，维修共计 107 处（襄城 45 次、樊城 62 次），其中带水作业 53 处。计划性施工停水 3 次（襄城 3 次）；临时性施工停水 71 次（襄城 28 次、樊城 43 次），其中由于第三方施工损坏造成的停水共计 8 次，占临时性施工停水 10.81%。

二、停水、维修事件分析

（一）停水、维修情况统计表

1、管网维修统计表：


2025 年 4 月							
类别		襄城		樊城		本年 合计	去年 合计
		本年实际	去年同期	本年实际	去年同期		
维修管道（处）		45	37	62	59	107	96
其 中	DN100 以下(含)	33	25	41	39	74	64
	DN150-DN250	7	7	14	10	21	17
	DN300-DN500	4	3	7	6	11	9
	DN600 以上	1	2	0	4	1	6

2、计划与临时性施工停水统计表：


2025 年 4 月			
停水	襄城管网公司	樊城管网公司	合计
计划性停水	3	0	3
非计划性停水	28	43	71
合 计	31	43	74

(二) 停水、维修情况统计分析图


1、管网维修次数统计图：

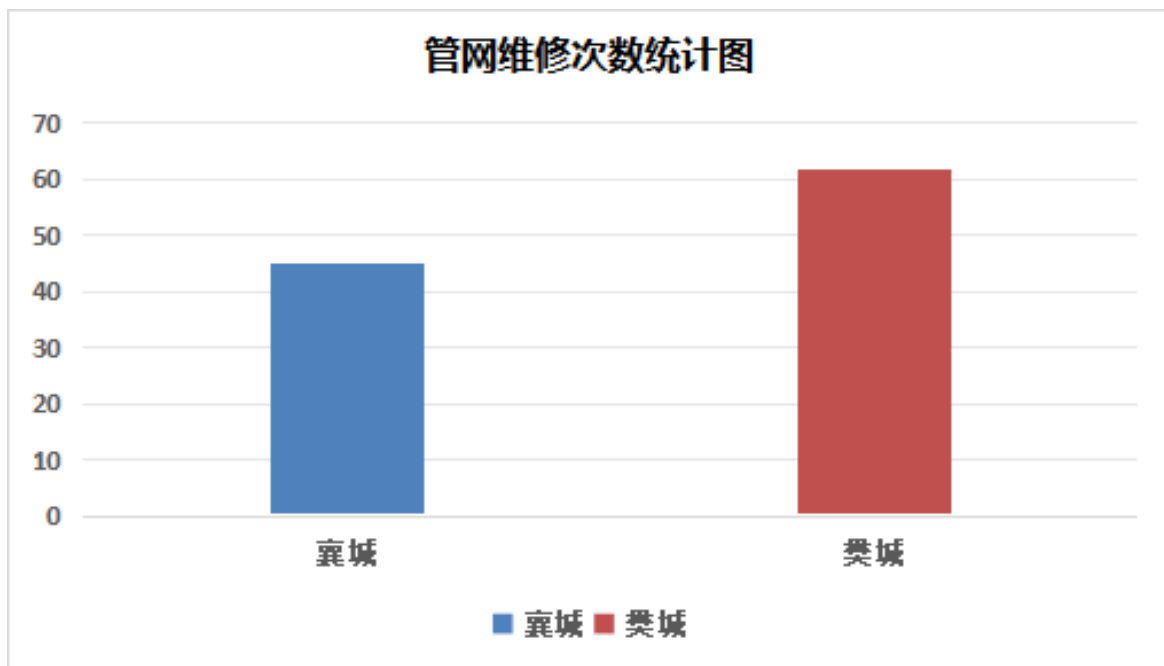

2、管网维修管径分析图：

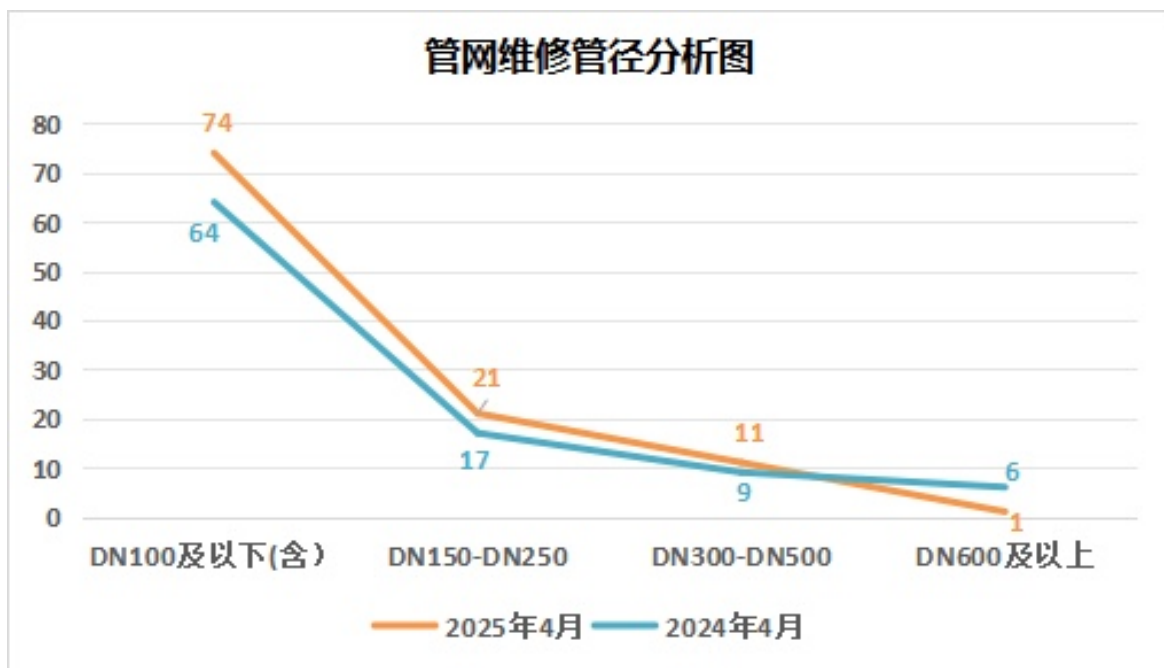

3、计划与临时性施工停水分析图：

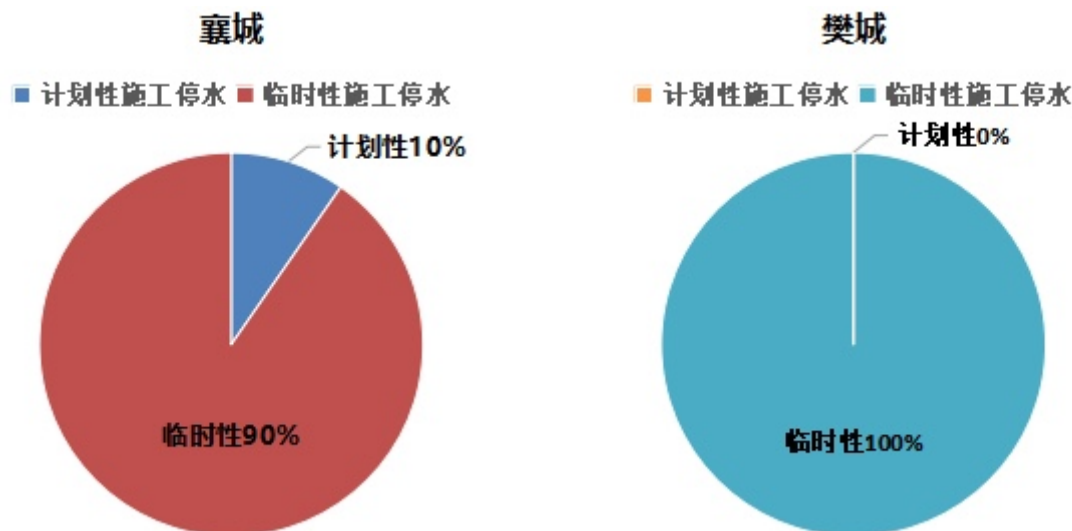

三、小结

(一) 本月襄阳路桥公司在襄城环山路琵琶山路口进行工程施工，两次将我司 DN500 供水管道挖破，造成该区域紧急停水维修，调度中心已提请襄城管网公司加强对此处供水管道的巡护巡查工作，同时告知襄阳路桥公司施工时加强安全施工管理。

(二) 本月维修均在用水低谷时段，采取降压供水和带水作业的方式进行，最大限度降低对用户用水的影响，抢修期间已及时安排为暂停供水区域的用户进行不间断的送水服务。

(三) 本月计划性施工停水 3 件：

1、3 月 28 日，为优化供水设施，需对襄城余家湖化工园的供水阀门进行更换，施工期间在余家湖化工园内、欧庙镇设置多处临时取水点，以保障市民不间断用水。

2、4 月 27 日，为优化供水设施，需对襄城青山路的供水管道进行改造，施工期间在青山路沿线设置多处临时取水点，以保障市民不间断用水。

3、4 月 30 日，为优化供水设施，需对襄城青山路的供水管道进行改造，施工期间在青山路沿线设置多处临时取水点，以保障市民不间断用水。

襄阳中环水务有限公司
2025 年 4 月 30 日
