

2025年5月停水事件分析报告

一、管网停水、维修事件概况

2025年5月，维修共计123处（襄城54次、樊城69次），其中带水作业43处。计划性施工停水1次（襄城1次）；临时性施工停水71次（襄城32次、樊城39次），其中由于第三方施工损坏造成的停水共计5次，占临时性施工停水6.94%。

二、停水、维修事件分析

（一）停水、维修情况统计表

1、管网维修统计表：


2025年5月							
类别	襄城		樊城		本年合计	去年合计	
	本年实际	去年同期	本年实际	去年同期			
维修管道(处)	54	53	69	49	123	102	
其中	DN100以下(含)	38	39	42	29	80	68
	DN150-DN250	8	11	18	10	26	21
	DN300-DN500	8	3	8	6	16	9
	DN600以上	0	0	1	4	1	4

2、计划与临时性施工停水统计表：


2025年5月			
停水	襄城管网公司	樊城管网公司	合计
计划性停水	1	0	1
非计划性停水	32	39	71
合计	33	39	72



(二) 停水、维修情况统计分析图

1、管网维修次数统计图：

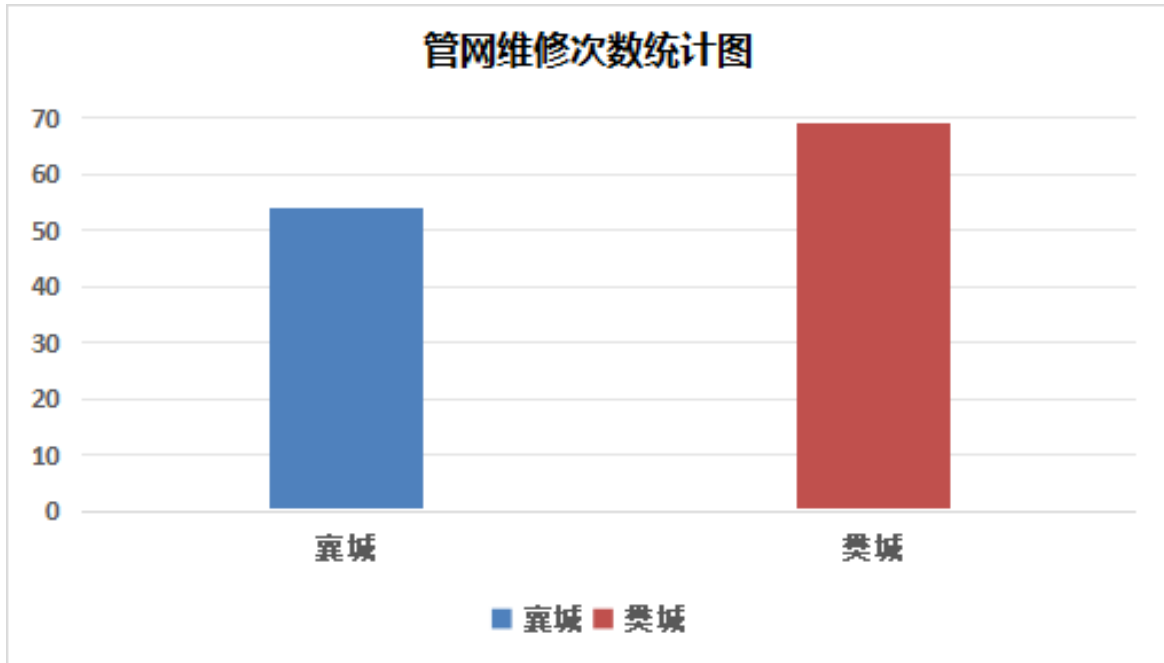

2、管网维修管径分析图：

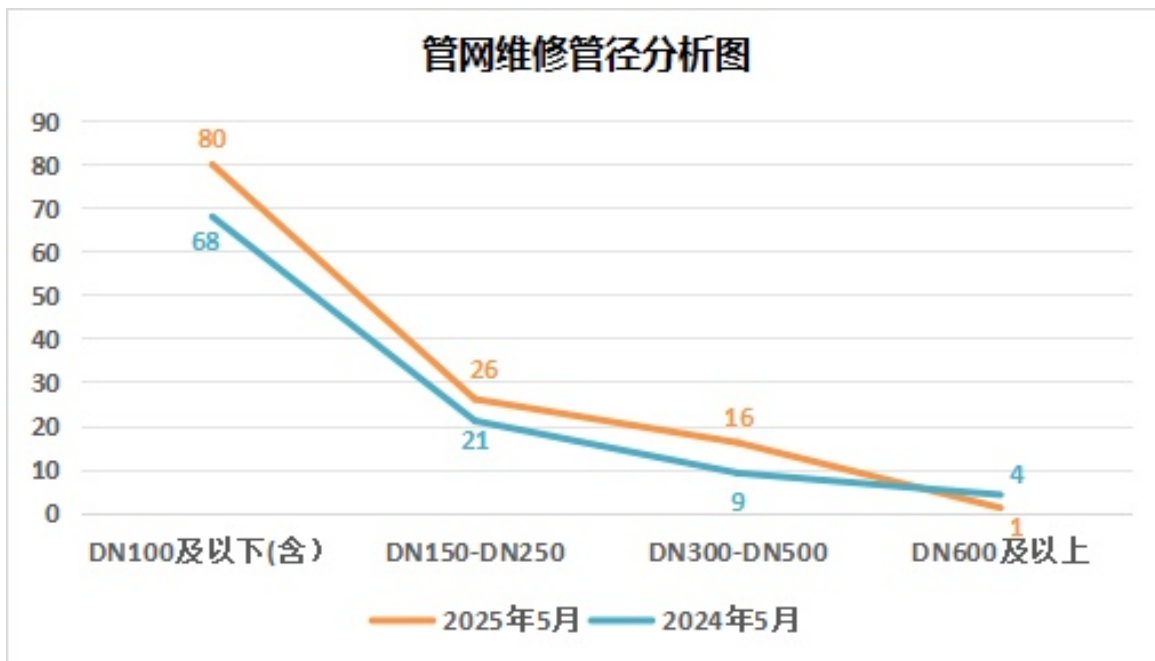

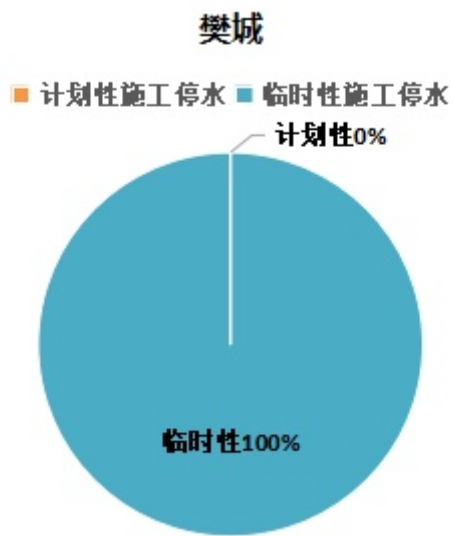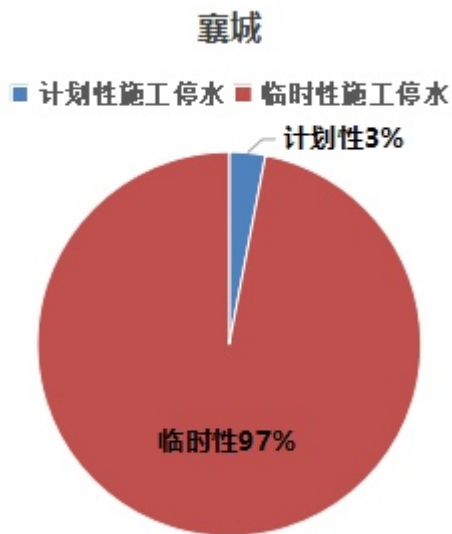

3、计划与临时性施工停水分析图：

三、小结

(一) 本月无集中性、同一管线频繁性维修事件。

(二) 本月维修均在用水低谷时段，采取降压供水和带水作业的方式进行，最大限度降低对用户用水的影响，抢修期间已及时安排为暂停供水区域的用户进行不间断的送水服务。

(三) 本月计划性施工停水 1 件：

5 月 26 日，为优化供水设施，需对襄城青山路的供水管道进行改造，施工期间在青山路沿线设置多处临时取水点，以保障市民不间断用水。

襄阳中环水务有限公司

2025 年 5 月 27 日
